


PLANIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS

Plazos a tener en cuenta para la compra y procesamiento de panel compuesto ExaBond / ExaGraf

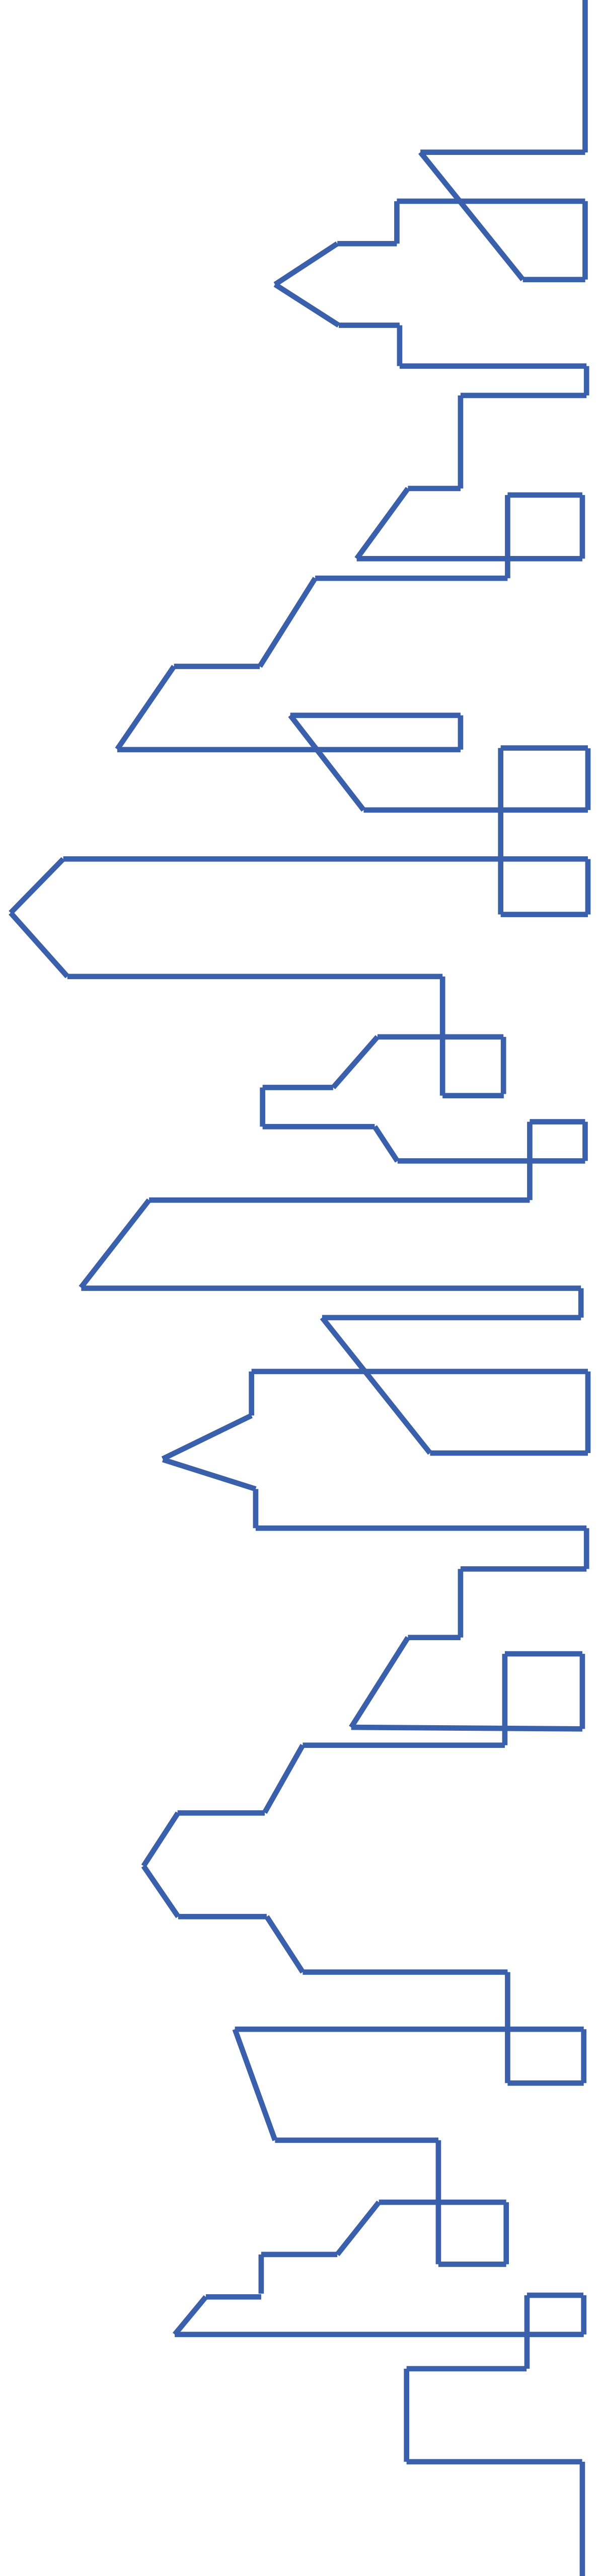

PLANIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS

Los procesos se realizan por orden de ingreso a cada etapa

01 | PRESUPUESTO ESTIMADO DE MATERIAL PROCESADO

EXABOND analiza los planos por orden de ingreso.
– Si está definida la cantidad de placas o m2 – **1 día**
– Si debemos revisar el proyecto y optimizar – **3 a 7 días.**

| PROCESO COMERCIAL DE RESERVA DE MATERIAL

02 | | PRESUPUESTO DE INGENIERÍA E INSTALACIÓN

El INSTALADOR por su lado te presupuesta la instalación, releva la obra, optará por el sistema de montaje, y generará los CAD definitivos.
Si no tienes un Instalador de confianza te podemos brindar datos de alguno de ellos.

03 | PRESUPUESTO DEFINITIVO DE MATERIAL Y PROCESOS

EXABOND recibe el plano CAD del Instalador Finales y re-optimiza, intercambiamos opinión con las definiciones del INSTALADOR y generamos un nuevo plano CAD ajustado.

| PROCESO COMERCIAL DE AJUSTE DE MATERIAL

04 | OK PLANOS DEFINITIVOS

Luego de las revisiones necesarias será el INSTALADOR quien aprueba el OK Final para producción de procesos.

05 | ASIGNACIÓN TURNO AL PLAN

EXABOND asigna fecha según disponibilidad de CNC.
Las obras ingresan al plan por orden de OK definitivo.
Se requieren de **2 a 5 días previos** para traducir CAD a CNC.

06 | ENTREGA MATERIAL PROCESADO

EXABOND coordina con el INSTALADOR la forma y lugar de entrega para que inicie la instalación.
Si una obra se divide por etapas, cada etapa es tratada como sub-obra con sus propias fechas.

PROCESOS EXABOND

Si la obra requiere los siguientes procesos, contemplar:

Rolado - **7 días hábiles**

Canto color - **7 días hábiles**
